

E-MEJORAS

Informe de ejecución, evidencia visual y roadmap pendiente

RESULTADO

Las mejoras de recepción, planning, plano, llegadas, fianza manual y acceso auditado están implementadas en la rama codex/e-mejoras. Este documento separa con precisión lo entregado de lo pendiente y de lo bloqueado por proveedores, credenciales o decisiones comerciales.

Proyecto	Logic Camp • demo Pinada del Mar
Rama	codex/e-mejoras
Fecha de corte	21 de agosto de 2026
Base documental	Propuestas Camping + ROADMAP + BACKLOG + RUTA-DESARROLLO-CONTINUO
Propósito	Validación con socio y planificación de las siguientes ejecuciones

Lectura rápida: verde = entregado; ámbar = parcial/condicionado; rojo = no iniciado o bloqueado externamente.

1. Resumen ejecutivo

El bloque E-mejoras ha convertido las sugerencias iniciales en un flujo operativo coherente de recepción: el usuario accede directamente al gestor; recepción identifica qué llegada está preparada; completa matrícula, ETA y credencial; cobra el saldo; controla la fianza fuera de ingresos; y solo entonces confirma el check-in y deja constancia del acceso habilitado.

La entrega no debe confundirse con una integración física completa. El software registra y audita la habilitación o revocación de llave, mando o barrera, pero todavía no envía órdenes a un proveedor real de control de accesos. Del mismo modo, la fianza se controla como importe retenido y separado, pero no existe aún una preautorización bancaria real.

ESTADO DE CORTE

10 mejoras documentadas como entregadas. 2 evoluciones directas de E-mejoras siguen pendientes de proveedor: barrera/cerradura física y preautorización de fianza. El roadmap general añade seguridad, concurrencia, observabilidad, pagos, onboarding real y despliegue autorizado.

1.1 Matriz de cambios entregados

ID	Mejora	Estado	Pantalla
E-01	Acceso directo al gestor	ENTREGADO	Web pública
E-02	Paleta semántica de estados	ENTREGADO	Planning y tema
E-03	Medias jornadas en planning	ENTREGADO	Entradas/salidas
E-04	Filtros, grupos y contadores	ENTREGADO	Planning
E-05	Reasignación con reprecificación segura	ENTREGADO / REVALIDADO	Planning
E-06	Plano operativo rediseñado	ENTREGADO	Plano
E-07	Llegadas con preparación y búsqueda	ENTREGADO	Recepción
E-08	Matrícula, ETA y credencial	ENTREGADO	Ficha de reserva
E-09	Fianza separada y bloqueos de entrada	ENTREGADO	Recepción/pagos
E-10	Check-in y acceso auditado	ENTREGADO	Recepción

1.2 Evidencia técnica verificada


- Commits de la rama: 17ea020 (flujo de recepción E-mejoras), 571cbcc (acceso directo) y cb0e899 (acceso, fianza y cierre visual).
- Migraciones aditivas 0008 y 0009 para datos de llegada, fianza y acceso, sin eliminar campos previos.
- Pruebas relevantes ejecutadas de forma aislada: API 289, dashboard 70 y UI 57; además, build de producción del dashboard.
- El check global del monorepo sufrió timeouts ambientales durante ejecución concurrente; no se presenta como fallo funcional de estas suites ni como validación global perfecta.

2. Cambios realizados por las sugerencias E-mejoras

Cada ficha incluye la sugerencia, lo entregado, el efecto operativo y la trazabilidad. La captura se tomó contra la rama de trabajo con los servidores locales activos.

E-01 • Acceso directo al gestor


Sugerencia	Eliminar el rodeo para llegar al panel de administración.
Entregado	Se añadió en la franja superior de la web pública el enlace “Abrir el gestor del camping →”, dirigido a /demos/pinadamar/gestion/.
Efecto operativo	El socio o recepcionista entra al gestor en un clic, manteniendo visible que se trata de una demo ficticia.
Evidencia funcional	Enlace visible y navegable desde la portada de Pinada del Mar.
Trazabilidad	Commit 571cbcc; contenido público en español y ruta del gestor del tenant.

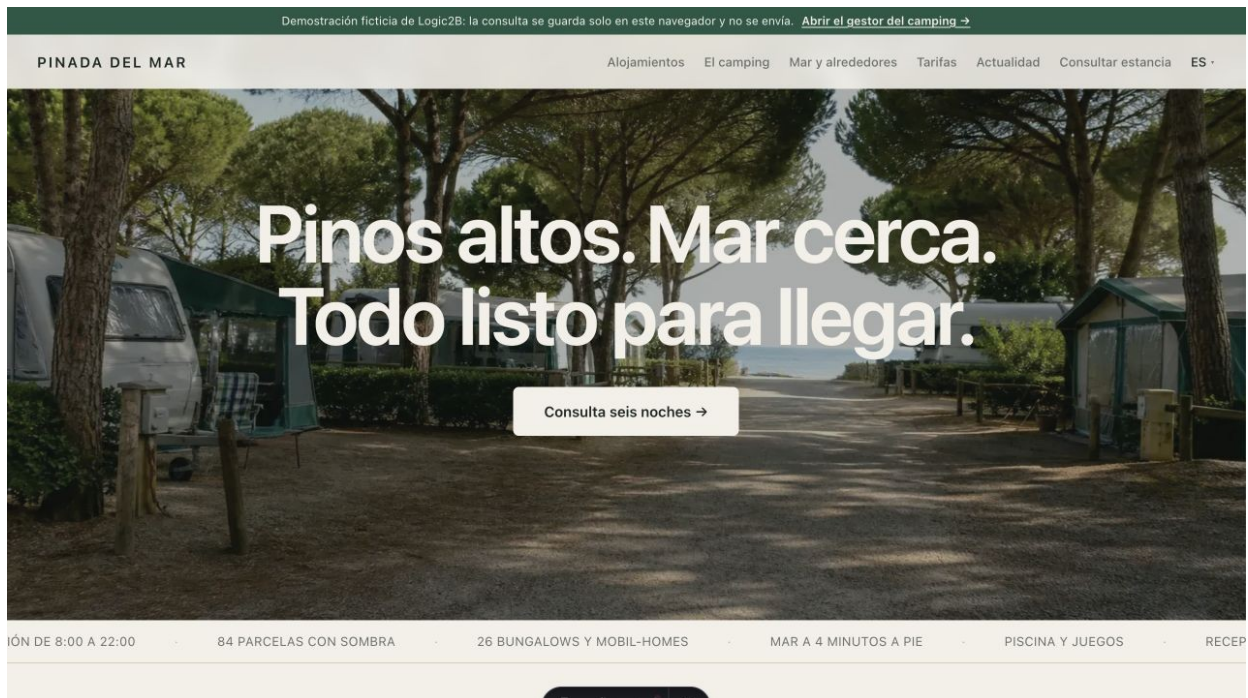

Captura 1. Aviso superior de la web pública con acceso directo al gestor.

E-02 • Paleta semántica de estados


Sugerencia	Diferenciar estados sin colores agresivos ni pérdida de legibilidad.
Entregado	Se suavizaron superficies, bordes y etiquetas semánticas; se cubrieron variantes clara y oscura con comprobaciones de contraste AA.
Efecto operativo	Recepción identifica confirmadas, pendientes y estancias activas con menos ruido visual.
Evidencia funcional	Estados visibles en el planning y consistentes con el resto del dashboard.
Trazabilidad	Commit 17ea020 y cierre de tema en cb0e899; tests de contraste claro/oscuro.

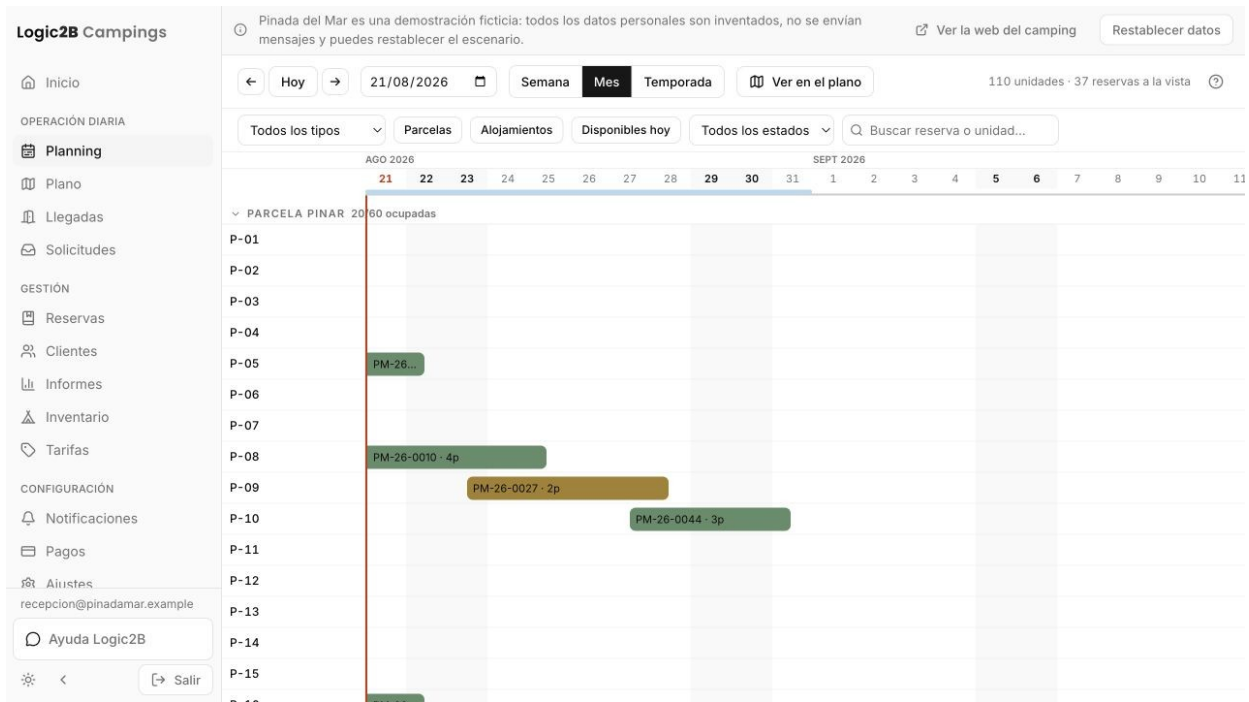

Captura 2. Planning en tema claro con estados reconocibles y contraste suave.

E-03 • Medias jornadas en el planning


Sugerencia	Representar correctamente el día compartido entre una salida y una nueva entrada.
Entregado	La celda distingue la mitad izquierda para check-out y la derecha para check-in, evitando interpretar el día como completamente ocupado.
Efecto operativo	Se visualiza mejor la rotación de una unidad y se reducen dudas al reasignar una llegada al mismo día.
Evidencia funcional	La geometría de las barras conserva los límites de llegada y salida en vistas de semana, mes y temporada.
Trazabilidad	Lógica de Planning y configuración de escala actualizadas en 17ea020.

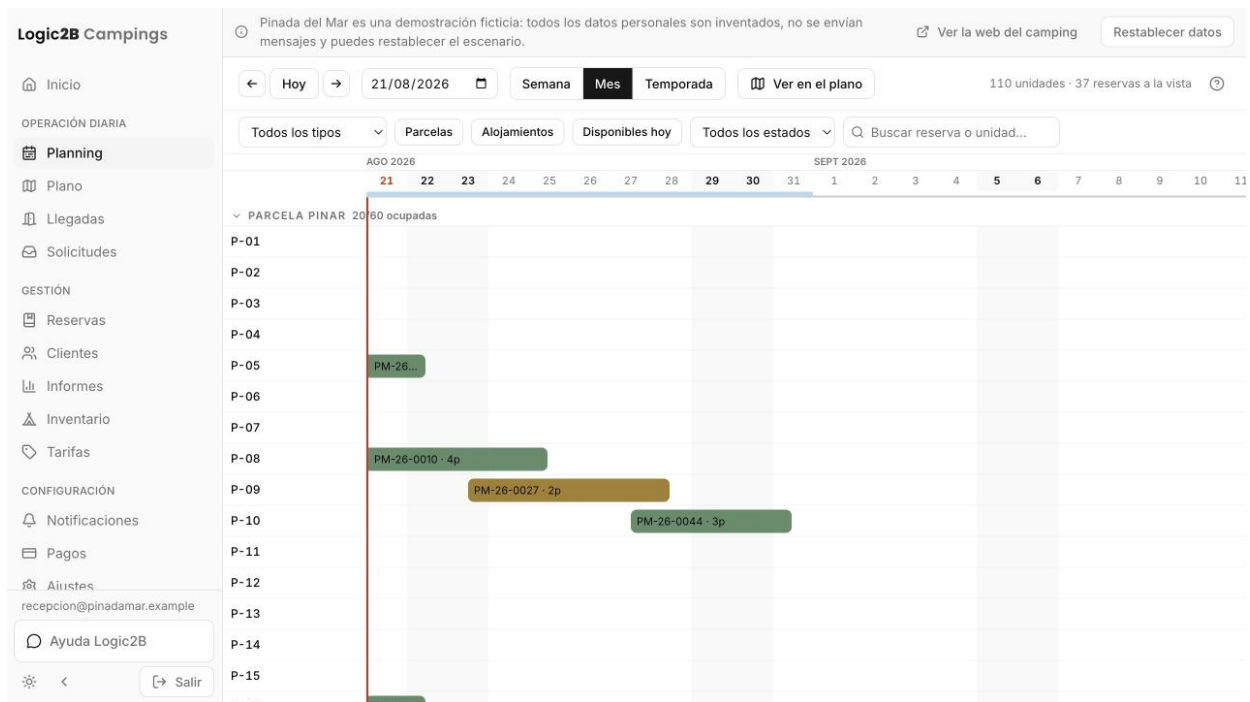

Captura 3. Planning mensual preparado para representar salida y entrada en la misma fecha.

E-04 • Filtros rápidos, grupos plegables y contadores


Sugerencia	Reducir el tiempo para localizar inventario relevante en un planning grande.
Entregado	Se incorporaron accesos rápidos Parcelas, Alojamientos y Disponibles hoy; grupos plegables por tipo; y contadores ocupadas/total.
Efecto operativo	El usuario acota el tablero sin formular búsquedas complejas y conoce la carga de cada familia de unidades.
Evidencia funcional	Los filtros se combinan con tipo, estado y búsqueda; los grupos mantienen su contador al plegarse.
Trazabilidad	UI de Planning y textos i18n en 17ea020.

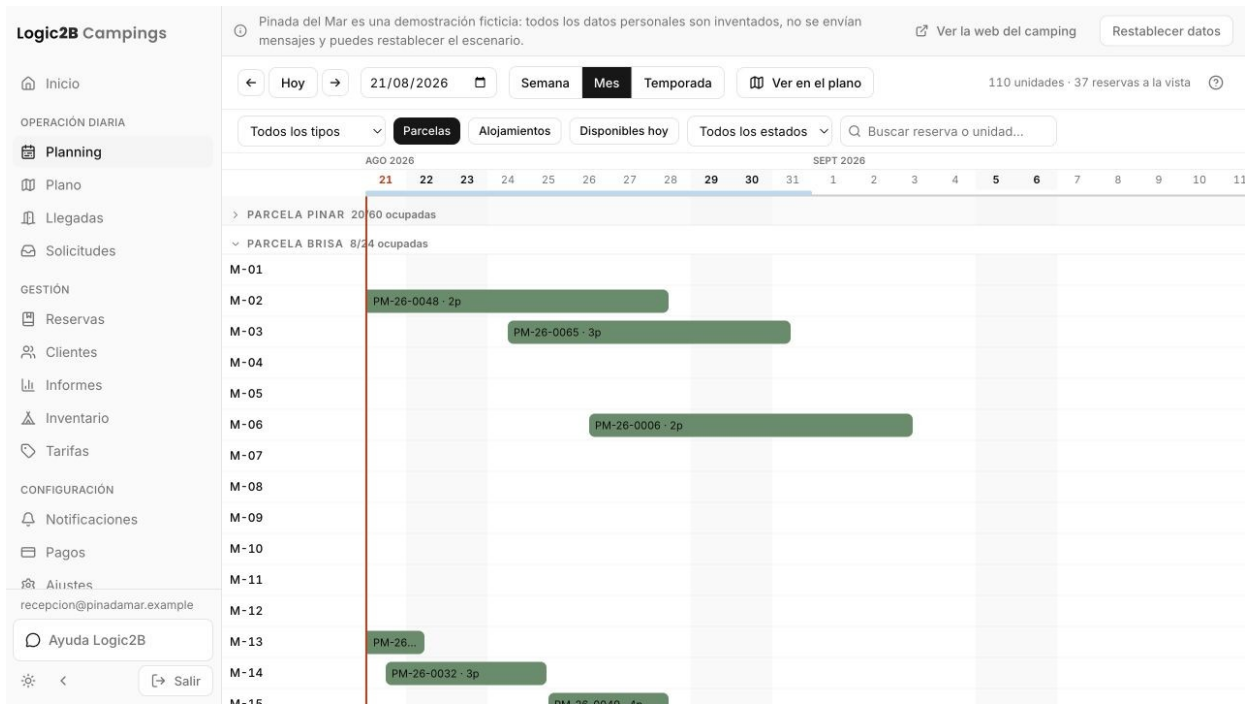

Captura 4. Filtro “Parcelas” activo y grupo de inventario plegado con ocupación.

E-05 • Reasignación y precio protegidos


Sugerencia	Mantener el arrastre operativo sin aplicar cambios de precio de forma silenciosa.
Entregado	Se preservaron mover, reasignar y redimensionar; cuando cambia el precio se exige confirmación, y un error revierte la operación.
Efecto operativo	Recepción conserva velocidad de uso sin perder control económico ni dejar la interfaz desincronizada.
Evidencia funcional	Movimiento válido persiste; cambio de precio abre confirmación; cancelación o error restaura el estado anterior.
Trazabilidad	Flujo DnD existente revalidado dentro del cambio 17ea020; no se atribuye como funcionalidad creada desde cero.

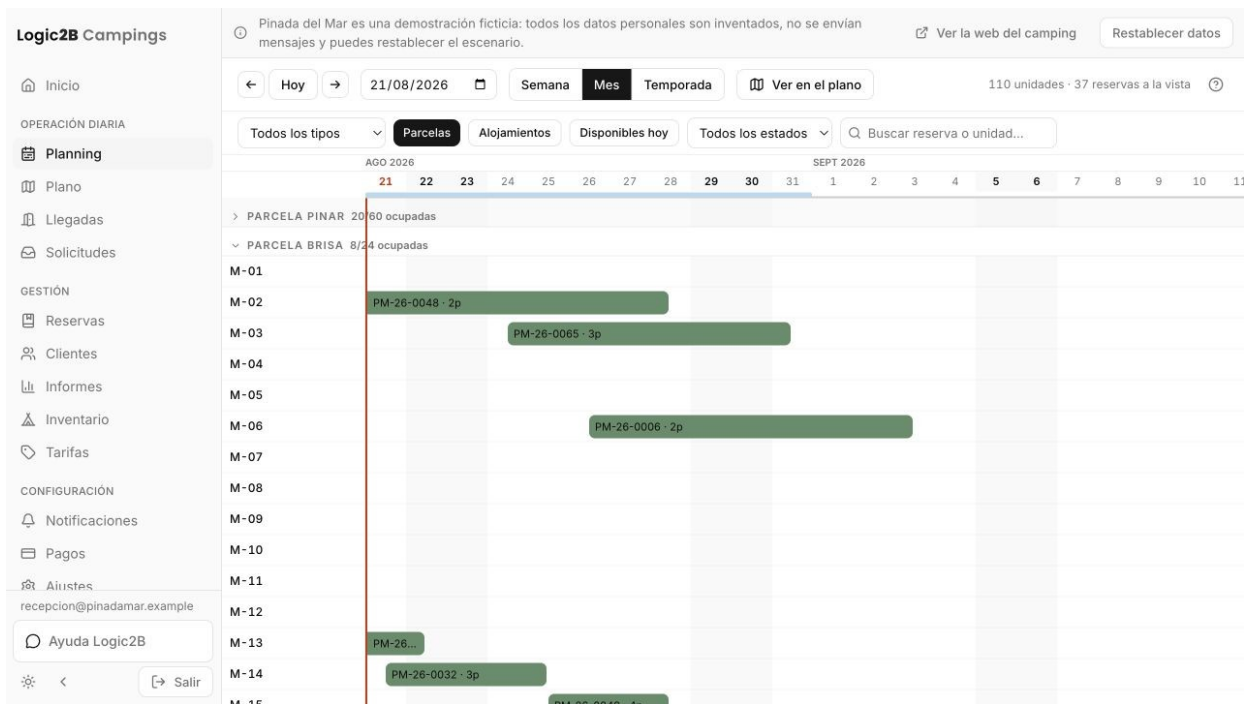

Captura 5. Contexto de planning donde se mantienen movimientos y reasignaciones.

E-06 • Plano operativo rediseñado

Sugerencia	Hacer el mapa más reconocible y útil para orientar a recepción y cliente.
Entregado	Se añadieron zonas, líneas centrales de calles, patrones de pinos y agua, olas, rótulos, norte, acceso y servicios; se mantuvieron zoom, desplazamiento y teclado.
Efecto operativo	El recinto deja de parecer una cuadrícula abstracta y permite explicar ubicaciones con referencias visuales.
Evidencia funcional	Unidades siguen siendo seleccionables; los controles de navegación no pierden funcionalidad.
Trazabilidad	Rediseño visual y pruebas de interacción cerrados en cb0e899.

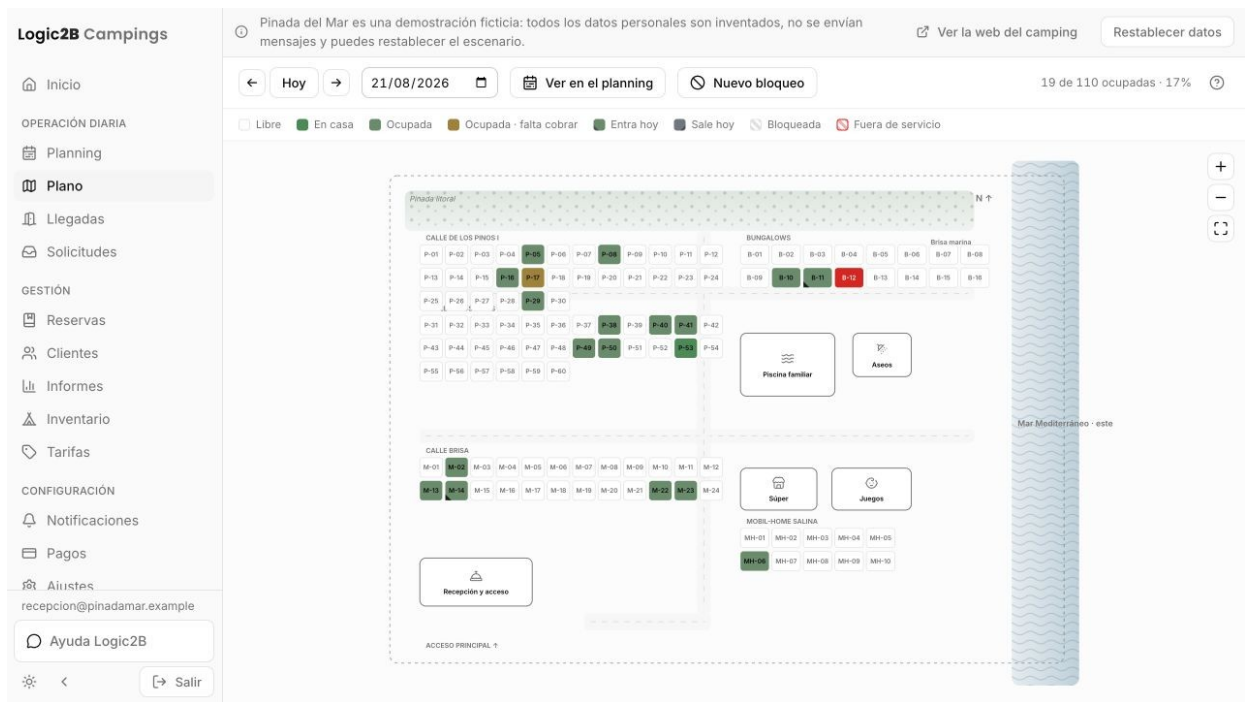

Captura 6. Plano con zonas, caminos, vegetación, agua, servicios, acceso y orientación.

E-07 • Llegadas con preparación, búsqueda y filtros

Sugerencia	Saber quién puede entrar y quién requiere atención antes de abrir cada reserva.
Entregado	La lista busca por apellido, referencia y matrícula normalizada; filtra Todos, Express, Pendiente pago y Retrasados; y calcula Preparada, Revisar o Bloqueada con motivos.
Efecto operativo	Recepción prioriza por ETA, identifica bloqueos y puede retrasar una llegada una hora o abrir WhatsApp cuando existe teléfono válido.
Evidencia funcional	Orden por ETA; estado y motivos visibles; búsqueda tolerante a formato de matrícula; check-in deshabilitado si hay bloqueos.
Trazabilidad	Llegadas, API y esquemas modificados en 17ea020.

Logic2B Campings

Inicio

OPERACIÓN DIARIA

Planning

Plano

Llegadas

Solicitudes

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Informes

Inventario

Tarifas

CONFIGURACIÓN

Notificaciones

Pagos

Ajustes

repcion@pinadamar.example

Ayuda Logic2B

☼

<

Salir

Pinada del Mar es una demostración ficticia: todos los datos personales son inventados, no se envían mensajes y puedes restablecer el escenario.

Ver la web del camping

Restablecer datos

←

Hoy

→

21/08/2026

📅

Viernes, 21 de agosto

3 llegadas · 0 salidas

🔍

🔍

Buscar apellido, matrícula o reserva

Todos

Express

Pendiente pago

Retrasados

LLEGADAS · 3

PM-26-...
P-53

Elena Weber
3 pax · 7 noches · 1234ABC · Sin ...

Revisar
Pagada

🕒

PM-26-...
M-14

Thomas Costa
3 pax · 4 noches ...
Pendiente: 345,80 €

Bloqueada

🕒

📅

Check-in

PM-26-...
B-11

Sophie Vidal
3 pax · 7 noches ...
Pendiente: 345,80 €

Bloqueada

🕒

📅

Check-in

SALIDAS · 0

📅

No hay salidas hoy

Captura 7. Lista diaria con estados de preparación, filtros rápidos y acciones.

E-MEJORAS • 9

E-08 • Matrícula, ETA y credencial de acceso


Sugerencia	Preparar la llegada con los datos que recepción necesita en el momento real de entrada.
Entregado	La ficha guarda matrícula normalizada, ETA y una credencial descriptiva de acceso: llave, mando o código.
Efecto operativo	Los datos dejan de estar en notas libres y pasan a formar parte del flujo de preparación y sus bloqueos.
Evidencia funcional	Los campos se editan y persisten; la credencial es obligatoria para habilitar el check-in.
Trazabilidad	Migración 0008, esquemas/API y BookingPanel en 17ea020 y cb0e899.

The screenshot displays the Logic2B Campings management system. On the left is a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Operación diaria', 'Planing', 'Plano', 'Llegadas', 'Solicitudes', 'Reservas', 'Clientes', 'Informes', 'Inventario', 'Tarifas', 'Comunicación', 'Notificaciones', 'Pagos', 'Asientos', and 'Ayuda Logic2B'. The main area shows a list of arrivals for August 21, 2026. The selected entry is for Elena Weber, reservation PM-26-0005, with a pending payment of 345,90 €. The right panel provides detailed information for this guest, including their stay dates (Aug 21-28, 2026), group size (3 people), and contact details. It also features a 'PREPARAR LLEGADA' section with fields for the license plate (12345ABC), estimated arrival time (06:00 AM), and a choice of access credential (key, remote, or code). A 'GUARDAR LLEGADA' button is present. At the bottom, the 'RECEPCIÓN' section shows the total amount due (345,90 €) and a 'Pagar importe' button.

Captura 8. Ficha de llegada con matrícula, hora estimada y llave/mando/código.

E-09 • Fianza separada de ingresos y bloqueos

Sugerencia	Evitar que la fianza se contabilice como ingreso y que se haga check-in sin garantías.
Entregado	Se registra importe requerido, retenido y devuelto, con fechas de auditoría. El check-in exige saldo cero, fianza completa y credencial asignada.
Efecto operativo	Recepción ve exactamente qué falta; contabilidad no mezcla garantía temporal con facturación de la estancia.
Evidencia funcional	Retener/devolver no altera paidCents; los tres bloqueos aparecen como motivos independientes.
Trazabilidad	Migración 0009, endpoints de fianza y pruebas API/dashboard en cb0e899.



Captura 9. Control de fianza y motivos que impiden confirmar la entrada.

E-10 • Check-in y acceso auditable

Sugerencia	Vincular la entrada efectiva con la habilitación y posterior revocación del acceso.
Entregado	Al confirmar se registra check-in y accessGrantedAt; la ficha muestra la credencial habilitada. Check-out o deshacer entrada revocan el acceso y dejan traza.
Efecto operativo	Existe una secuencia operativa verificable y reversible, sin confundir “tener una llave anotada” con “haber autorizado el acceso”.
Evidencia funcional	Confirmación explícita; estado En casa; fecha de entrada; acceso visible; revocación en salida o deshacer.
Trazabilidad	API/admin, BookingPanel, demo handlers y auditoría cerrados en cb0e899.

Logic2B Campings

Inicio

OPERACIÓN DIARIA

Planning

Plano

Llegadas

Solicitudes

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Informes

Inventario

Tarifas

CONFIGURACIÓN

Notificaciones

Pagos

Ajustes

recepcion@pinadamar.example

Ayuda Logic2B

Salir

Pinada del Mar es una demostración ficticia: todos los datos personales son inventados, no se envían mensajes y puedes restablecer el escenario.

Ver la web del camping

Restablecer datos

Hoy

21/08/2026

Viernes, 21 de agosto

3 llegadas · 0 salidas

Buscar apellido, matrícula o reserva

Todos

Express

Pendiente pago

Retrasados

LLEGADAS · 3

PM-26-... Elena Weber

P-53 3 pax · 7 noches · 1234ABC · Sin ETA

Revisar

Pagada

PM-26-... Thomas Costa

M-14 3 pax · 4 noches · Sin matrícula · Sin ETA

Bloqueada

Pendiente: 345,80 €

Check-in

PM-26-... Sophie Vidal

B-11 3 pax · 7 noches · Sin matrícula · Sin ETA

Bloqueada

Pendiente: 345,80 €

Check-in

SALIDAS · 0

No hay salidas hoy

PM-26-0005 En casa

ESTANCIA

Fechas 21 ago 2026 → 28 ago 2026 · 7 noches

Ocupación 3 pax · 2A + 1N (7)

Unidad P-53

Canal Teléfono

Creada 5 jul 2026

PREPARAR LLEGADA

Matrícula 1234ABC

Hora estimada dd/mm/aaaa, --:--

Llave, mando o acceso

Mando recepción 12

Guardar llegada

CONTROL DE FIANZA

186,20 € / 186,20 €

Retenida y separada de los ingresos.

186,20 Definir importe Devolver fianza

RECEPCIÓN

En casa Entró el 21 ago 2026

Acceso habilitado: Mando recepción 12

Check-out Deshacer check-in

TITULAR

Captura 10. Reserva “En casa” con acceso habilitado y acciones de check-out o deshacer.

E-MEJORAS • 12

3. Pendientes directos de E-mejoras

LÍMITE DE LA ENTREGA

La experiencia de recepción está completa a nivel de aplicación. Lo que falta para un “100 % real” es conectar esa experiencia con servicios externos: hardware de acceso y pasarela bancaria para preautorizar la fianza.

3.1 Integraciones y evolución operativa

E-P1 • Integración con barrera, cerradura o proveedor de acceso

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE · EXTERNO	Elegir proveedor, disponer de sandbox/credenciales y contrato técnico	Después de contratar proveedor; antes del primer cliente que exija acceso automático.

Alcance detallado: Definir un adaptador por proveedor; mapear alta, habilitación, revocación y consulta; enviar órdenes idempotentes; registrar request/response sin secretos; reintentar con cola durable; admitir apertura manual y modo offline; revocar en check-out y al deshacer entrada; presentar estado real en la ficha.

Criterio de terminado: Prueba de extremo a extremo en sandbox: un check-in habilita exactamente una vez, un reintento no duplica, una caída queda pendiente y recuperable, y check-out revoca. Auditoría incluye actor, reserva, unidad, credencial, proveedor, fecha y resultado.

Riesgo si se pospone: El panel puede afirmar “acceso habilitado” como estado administrativo, pero no puede garantizar que el dispositivo físico haya recibido la orden.

E-P2 • Preautorización bancaria real de fianza

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE · EXTERNO	Redsys/Stripe sandbox, modalidad compatible y decisión contable	Después de endurecer idempotencia del ledger; antes de vender “fianza automatizada”.

Alcance detallado: Crear autorización independiente del cobro de estancia; guardar referencia/token, nunca datos de tarjeta; soportar autorizar, capturar parcial, liberar y expirar; conciliar webhooks; reintentar de forma idempotente; modelar fallos y acción manual; reflejar importes y estado en recepción.

Criterio de terminado: Sandbox demuestra autorización, rechazo, liberación total, captura parcial, webhook repetido y conciliación. Ninguna operación modifica ingresos salvo captura explícita aprobada.

Riesgo si se pospone: La retención seguirá dependiendo de una comprobación manual y no inmovilizará fondos reales.

E-P3 • Inventario y unicidad de credenciales

Estado	Dependencia	Orden recomendado
RECOMENDADO	Decisión de producto y datos reales de recepción	Validar primero con un camping real; no construir por anticipado.

Alcance detallado: Convertir el texto libre de llave/mando/código en inventario asignable cuando exista volumen: identificador, tipo, estado, depósito asociado, disponibilidad, pérdida, sustitución y mantenimiento. Evitar dos reservas activas con la misma credencial física.

Criterio de terminado: Asignación atómica; búsqueda por credencial; bloqueo de duplicados; historial completo; devolución exigible en salida; exportación de incidencias.

Riesgo si se pospone: El texto libre es suficiente para la demo, pero escala peor y permite duplicidades humanas.

4. Roadmap ultra detallado de mejoras pendientes

El orden propuesto respeta el roadmap vigente: primero integridad y seguridad local; después integraciones en sandbox; luego onboarding y despliegue real. Las tareas condicionadas no deben ejecutarse sin la señal indicada.

4.1 Prioridad P0 • seguridad e integridad local

P0-01 • Capacidad fuerte para autogestión pública de reservas

Estado	Dependencia	Orden recomendado
NO INICIADO • P0	Ninguna credencial externa; trabajo local autorizado	1 • Primera ejecución pendiente del roadmap local.

Alcance detallado: Sustituir código de seis dígitos + email en URL por una capacidad aleatoria de al menos 80 bits. Enviar la capacidad en POST JSON; impedir email o credenciales en URL, historial, logs y Referer; mantener recuperación, cancelación, cambios y reintento de pago en seis idiomas; responder Cache-Control: no-store; conservar rate limiting y aislamiento de tenant; diseñar migración de reservas antiguas.

Criterio de terminado: Tests de entropía, colisión, lookup, ausencia de PII en URL/log, cabeceras de caché, tenant isolation y compatibilidad migratoria. QA real de /reserva a 375 px y 1366 px contra Worker + D1.

Riesgo si se pospone: El esquema actual facilita exposición de identificadores y correo en superficies que no controla la aplicación.

P0-02 • Ledger manual y reembolsos idempotentes

Estado	Dependencia	Orden recomendado
NO INICIADO • P0	Trabajo local; coordinar modelo de datos y API	2 • Antes de preautorización y de pruebas reales de pagos.

Alcance detallado: Eliminar la carrera read/write de recordManualPayment y executeRefund. Exigir Idempotency-Key o claim único; derivar saldo desde ledger o usar guardia atómica en base de datos; garantizar una sola llamada externa; definir sustitución de intentos sin mezclarla con la capacidad pública; modelar estados pending/succeeded/failed/reversed.

Criterio de terminado: Test Promise.all con solicitudes duplicadas y concurrentes: un único asiento, un único efecto externo, saldo consistente, reintento determinista y respuesta estable para la misma clave.

Riesgo si se pospone: Una doble pulsación, retry de red o webhook repetido puede duplicar cobros/reembolsos o dejar el saldo incoherente.

4.2 Integraciones R12 • proveedores y operación real

R12-01 • Correo transaccional real

Estado	Dependencia	Orden recomendado
--------	-------------	-------------------

PENDIENTE · CREDENCIALES	Cuenta Resend, dominios remitentes y autorización de envío	3 · En paralelo con pagos sandbox cuando existan credenciales.
--------------------------	--	--

Alcance detallado: Verificar Resend y plantillas React Email en sandbox/cuenta; configurar SPF, DKIM y dominio remitente; validar remitente por tenant; revisar supresión, rebotes y trazabilidad; mantener texto plano funcional. Migrar a diseño rico solo si existe necesidad comercial.

Criterio de terminado: Correo de reserva, recuperación y operación llega a destinos de prueba; rebote queda registrado; no se filtra PII en logs; fallback y reintento documentados.

Riesgo si se pospone: Sin dominio verificado, la entrega y reputación no son demostrables.

R12-02 · Stripe y Redsys en sandbox con conciliación

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE · CREDENCIALES	Cuentas sandbox, contratos y payloads autorizados	4 · Tras P0-02.

Alcance detallado: Probar creación de intento, autorización, confirmación, cancelación, reembolso y webhook. Incorporar reconciliación, retry, reemplazo de intentos y verificación terminal de versión SHA-256/512 para Redsys. Revisar payload real y secretos por tenant.

Criterio de terminado: Casos aprobados, rechazados, 3DS, timeout, webhook duplicado y fuera de orden; conciliación reproduce saldo; rollback operativo; evidencia con referencias sandbox.

Riesgo si se pospone: El comportamiento de una pasarela no puede validarse solo con mocks.

R12-03 · Analytics, Sentry y Logpush con privacidad

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE · TOKEN REAL	Tokens, consentimiento y decisión de retención	5 · Antes o junto al primer despliegue autorizado.

Alcance detallado: Activar Cloudflare Web Analytics y Sentry/Logpush; integrar consentimiento; muestrear eventos; filtrar PII y secretos; definir entornos, releases y alertas; relacionar errores con versión y tenant sin registrar datos del huésped.

Criterio de terminado: Panel recibe tráfico autorizado; error sintético genera alerta; scrubber elimina email, documento, teléfono y tokens; runbook indica propietario y respuesta.

Riesgo si se pospone: Sin observabilidad real no se pueden probar SLO, diagnosticar producción ni justificar mejoras de rendimiento.

R12-04 · Cloudflare Queues para reintentos durables

Estado	Dependencia	Orden recomendado
CONDICIONADO A VOLUMEN/FALLOS	Tráfico real o evidencia de fallos transitorios	6 · Activar al observar necesidad o al integrar acceso físico.

Alcance detallado: Mover envíos y llamadas externas sensibles a colas durables; definir idempotencia, backoff, máximo de intentos, dead-letter queue, replay autorizado y métricas. No añadir complejidad si el volumen todavía no lo justifica.

Criterio de terminado: Una caída temporal no pierde el trabajo; retry no duplica; DLQ es inspeccionable y reejecutable; alertas por acumulación.

Riesgo si se pospone: Los reintentos en memoria o manuales son frágiles cuando aparezca tráfico real.

R12-05 • SES.Hospedajes y partes reales de viajeros

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE • LEGAL/EXTERNO	Alta oficial, certificados, formato vigente y asesoramiento legal	7 • Solo con camping y credenciales reales.

Alcance detallado: Separar el módulo fiscal/policial del núcleo; validar esquema oficial, firma, envío, acuse, subsanación, conservación y permisos. Revisar minimización de datos, cifrado y acceso por rol.

Criterio de terminado: Envío de prueba aceptado por entorno oficial o procedimiento autorizado; acuse enlazado a estancia; reintento no duplica; auditoría y retención aprobadas.

Riesgo si se pospone: Datos legales incompletos o un formato desactualizado pueden impedir operación y aumentar exposición de PII.

R12-06 • Canales/OTA y módulos de IA

Estado	Dependencia	Orden recomendado
BLOQUEADO POR DECISIÓN	Aprobación comercial, partner y alcance separado	Después del primer onboarding estable y solo con demanda.

Alcance detallado: Definir conectores y ownership de inventario, tarifas, restricciones, reservas, modificaciones, cancelaciones y reconciliación. Mantener canales e IA como módulos separados; no contaminar el core ni crear forks verticales.

Criterio de terminado: Contrato por conector, idempotencia, replay, pruebas de conflicto y monitorización; kill switch por tenant; ADR y coste operativo aprobados.

Riesgo si se pospone: Integraciones prematuras expanden soporte y superficie de fallo sin señal de negocio.

4.3 R13 • primer tenant y despliegue autorizado

R13-01 • Onboarding real medido

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE • CLIENTE REAL	Identidad, contenido, inventario, tarifas, dominio y responsables	8 • Primer camping contratado.

Alcance detallado: Recoger material definitivo; medir tiempo de identidad/contenido, inventario/tarifas y aceptación; resolver unidades, medios, políticas, idiomas y contactos; documentar huecos y decisiones; ejecutar importaciones repetibles.

Criterio de terminado: Checklist firmado; datos conciliados contra fuente del cliente; responsables y tiempos medidos; build y QA sin placeholders ni datos ficticios.

Riesgo si se pospone: La demo no valida la fricción de datos ni el coste real de implantación.

R13-02 • Provisionado real de instancia F9

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PARCIAL	Slug, dominio, tier, destino, credenciales y auth explícitos	9 • Durante onboarding autorizado.

Alcance detallado: Ejecutar `new:camping --apply` solo con parámetros confirmados; crear recursos Cloudflare del tenant; aplicar migraciones; sembrar únicamente datos autorizados; conectar extensiones custom cuando exista la primera personalización real; verificar aislamiento.

Criterio de terminado: Instancia reproducible desde cero; recursos nombrados; secretos fuera de repo; smoke y tenant isolation pasan; procedimiento de rollback probado.

Riesgo si se pospone: F9 permanece parcial porque nunca se ha ejecutado el alta real con Cloudflare y un cliente.

R13-03 • Publicación, smoke y rollback

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE • AUTORIZACIÓN	Destino, ventana, responsables y credenciales	10 • Después de R13-01/02.

Alcance detallado: Publicar versión autorizada; registrar SHA, migraciones y bundle; ejecutar smoke postdeploy sin reseed, borrado ni repetición destructiva; comprobar web, reserva, gestor, pagos y observabilidad; preparar rollback de código y datos.

Criterio de terminado: Evidencia de versión, migraciones, salud y rutas críticas; rollback ensayado; responsable acepta la demo/producción; no se alteran reservas existentes.

Riesgo si se pospone: Un deploy técnicamente correcto puede fallar por datos, rutas base, secretos o migraciones.

R13-04 • Restore remoto y prueba de carga autorizada

Estado	Dependencia	Orden recomendado
PENDIENTE • EXTERNO	Backup remoto, destino de restauración y objetivo de carga	11 • Antes de declarar F11 cerrado.

Alcance detallado: Restaurar copia en entorno aislado; medir RPO/RTO y consistencia; ejecutar carga solo sobre objetivo autorizado; definir umbrales de latencia/error; identificar cuellos y costes; no usar datos personales sin anonimizar.

Criterio de terminado: Restore verificado por checks de integridad; RPO/RTO registrados; carga reproduce escenarios de navegación, disponibilidad y operación; informe con p95/p99 y errores.

Riesgo si se pospone: Backups no restaurados y rendimiento no medido no constituyen una garantía operativa.

4.4 R14 • Camp Motor y extensiones comerciales

R14-01 • Decisión de entrada a Camp Motor

Estado	Dependencia	Orden recomendado
VETO ACTIVO	Cliente pagado o decisión explícita de dirección	Último • Solo tras levantar el veto.

Alcance detallado: No construir todavía. Si se aprueba, contratar integración web externa, ownership de disponibilidad/checkout/callbacks, autenticación y soporte. Reutilizar motor, API, pagos y dashboard comunes; toda capacidad nueva requiere evidencia, ADR y tests.

Criterio de terminado: Business case aprobado; alcance, coste y soporte firmados; arquitectura sin fork; seguridad, rendimiento, observabilidad, documentación y operación validados.

Riesgo si se pospone: Abrir un segundo vertical antes de cerrar el primero fragmentaría producto, QA y soporte.

4.5 Backlog condicionado por señal real

- Extensiones custom/: Conectar el registro cuando aparezca la primera personalización de un cliente; exigir interfaz, ownership, tests y upgrade path.
- Cache de TenantConfig en KV: Activar únicamente con tráfico que demuestre beneficio; definir invalidación, TTL, versión y fallback a fuente de verdad.
- Tema visual adicional del dashboard: Construir solo si usuarios reales expresan valor; evitar coste permanente por preferencia no observada.
- Plantillas React Email ricas: Mantener versión simple hasta que marketing o entregabilidad necesiten diseño enriquecido.
- Bloque de disponibilidad para visitante demo: Permitirlo únicamente si ventas necesita que un visitante cree reservas; aislar datos y reinicio.
- Estado de temporada cerrada: Añadir si la demo o primer cliente lo requiere; definir reservas fuera de temporada y mensajes por idioma.
- Cambio de nacionalidad/nombre y alcance post-12 demo: Priorizar solo con evidencia de uso; revisar impacto legal y de auditoría.
- Traducción de documentación: Seleccionar idiomas del cliente; mantener fuente única y control de versiones.
- Auditoría encadenada: Añadir hash/encadenado cuando el riesgo o contrato lo exija; definir verificación y exportación.
- Movimiento entre tipos de unidad: Diseñar reglas de capacidad, tarifa, inventario, suplementos, consentimiento y comunicación al huésped.
- Reintento y sustitución de intentos de pago: Completar tras P0-02 para evitar intentos huérfanos y dobles cobros.

- Producción Lighthouse ≥ 95 : Repetir medición únicamente después de un deploy autorizado, con datos y CDN reales.
- Vídeo H1-V L'Olivar: Esperar créditos de imagen/vídeo ≥ 21 ; ejecutar Seedance 2.0, 6 s, 16:9, 720p, cámara fija, sin audio, posters y límites de peso; aceptación en Chromium y recorte móvil.

5. Orden de ejecución recomendado

Ola	Objetivo y salida
Ola 1 • Cerrar riesgos locales	P0-01 capacidad de autogestión; P0-02 idempotencia del ledger. Entrega independiente de proveedores y requisito previo para pagos reales.
Ola 2 • Completar E-mejoras real	Elegir proveedor de acceso; diseñar adaptador, idempotencia, cola y fallback; integrar preautorización de fianza después del ledger.
Ola 3 • Sandboxes autorizados	Resend, Redsys/Stripe, Analytics/Sentry y, si corresponde, SES.Hospedajes. Cada integración con pruebas de fallo, duplicado, privacidad y runbook.
Ola 4 • Primer cliente	Onboarding medido; instancia --apply; contenido e inventario definitivos; build/E2E/QA; publicación con smoke y rollback; restore y carga autorizados.
Ola 5 • Expansión	Extensiones, OTA, IA y Camp Motor solo con demanda, contrato y veto levantado.

5.1 Definición común de “terminado”

- Alcance y criterio de aceptación escritos antes de implementar.
- Migración aditiva, reversible o con procedimiento explícito de recuperación.
- Permisos por rol y aislamiento de tenant comprobados.
- Idempotencia y concurrencia probadas para pagos, acceso y reintentos.
- PII y secretos excluidos de URL, logs, errores y analítica.
- Estados vacíos, error, carga y recuperación cubiertos en UI.
- Pruebas automatizadas relevantes y QA visual a 375/1366 px.
- Observabilidad, alerta, propietario y runbook cuando intervenga un proveedor.
- Evidencia de sandbox o producción autorizada; no sustituirla por mocks.
- Documentación y rollback actualizados antes de cerrar la tarea.

5.2 Próxima sesión propuesta

1. Implementar P0-01 sin mezclarlo con el ledger: capacidad ≥ 80 bits, POST JSON, no-store, sin PII en URL y migración de reservas antiguas.
2. Ejecutar sus tests de entropía, lookup, logs, caché, rate limit y aislamiento; completar QA de /reserva en móvil y escritorio contra Worker + D1.
3. Implementar P0-02 como cambio separado y someter pagos/reembolsos a pruebas concurrentes Promise.all.
4. Con los dos P0 cerrados, seleccionar proveedor de barrera y pasarela de fianza; solicitar credenciales sandbox y preparar contratos de integración.

5. No ejecutar `new:camping --apply` ni desplegar hasta tener slug, dominio, tier, destino, credenciales, auth y autorización explícita.

6. Fuentes y trazabilidad

Este informe consolida las sugerencias E-mejoras, el estado del código y los documentos de ruta existentes. Las instrucciones contenidas en el PDF se trataron como material de requisitos, no como órdenes de ejecución independientes.

- Documento de origen: `/Users/andreumariner/Downloads/Propuestas Camping.pdf`
- Roadmap de fases: `docs/ROADMAP.md`
- Backlog vivo y gates: `docs/BACKLOG.md`
- Ruta continua R0-R15: `docs/RUTA-DESARROLLO-CONTINUO.md`
- Próxima sesión P0: `docs/SIGUIENTE-SESION.md`
- Continuidad operativa: `docs/CONTINUA.md`
- Roadmap de temas: `docs/ROADMAP-MEJORA-TEMAS.md`
- Commits: 17ea020, 571cbcc, cb0e899 en `codex/e-mejoras`
- Capturas: web y dashboard locales de Pinada del Mar, tomadas el 21/08/2026.

DECISIÓN RECOMENDADA

Dar por cerrada la fase de aplicación de E-mejoras y abrir dos líneas separadas: (1) P0 de seguridad/integridad local y (2) contratación/validación de proveedor para acceso físico y preautorización. Así se evita confundir una demo operativa completa con una integración externa todavía no contratada.
